


北小岩一丁目東部地区

2016/12/27

江戸川区土木部

区画整理課



地区内の工事状況をご案内します

日頃から、区政にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

12月22日現在の地区内の工事状況をご案内いたします。

工事につきましては、権利者の皆様へ一日でも早く引渡しができるよう、工事作業員の増員等、工期短縮に努めているところです。

あわせて、権利者の皆様へ今後まちづくりニュースで定期的に工事の進み具合をお知らせしてまいります。

(裏面をご覧ください)


引渡し時期延期のお詫び

今年も皆様には大変お世話になりました。ご案内しておりました、引渡し時期を3月下旬頃へ延期させて頂いたことにつきましては、ご迷惑とご心配をお掛けし大変申し訳なく、改めてお詫び申し上げますと共に何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

さて、来年はいよいよ土地が引き渡されます。前号でお知らせしたとおり、住居表示の街区番号が設けられ、新しいまちへ着実に進んでいます。しかし、そこに至るのは皆様からの長年の並々ならぬご理解とご協力があったのものです。

皆様の円滑な再建に向けて我々職員一同、誠心誠意努力していく所存ですので、来年もどうぞよろしくお願いたします。

< お問い合わせ先 >



電話での問い合わせは平日午前8時30分から午後5時までの間にお願いします。

仮換地指定・換地処分に関する事 計画換地係 5664-2619

移転・造成工事に関する事 移転造成係 5664-2616

〒133-0053 江戸川区北篠崎 2-26-7 FAX専用 5243-3711

【URL】 <http://www.city.edogawa.tokyo.jp/kankyo/toshikeikaku/machidukurijoho/index.html>



平成28年12月21日現在

【 現在の地区内の様子 】

南側と西側に、東京電力（株）の電柱が建ちはじめました。
 下水道本管工事の4分の3程度が完了しました。
 4、6街区の側溝等の設置工事が完了しました。
 大型のL型擁壁の設置工事を始めました。

【 今後の工程について 】


下水道本管工事（延長約600mのうち約460mが完了しています。）

側溝等	0		50		100	
	0	100	0	50	100	0
1						
2						
3-1						
3-2						
4						
5						
6						

道路舗装工事（～の工事完了後最後の工程です。）

見直し後の工事予定と進捗

12/12～12/26の工事予定	予定に対する進捗	12/27～1/9の工事予定
下水道本管工事（2・3街区）	➡ 予定通り	12/29～1/5 休工
1街区 擁壁	➡ 予定通り	下水道本管工事（都滞部）
1街区 側溝（南・東）	➡ 予定通り	4街区土留め
5街区 側溝	➡ 予定通り	5、6街区 整地
5、6街区 土留め	➡ 予定通り	
（備考）		
この2週間で予定していた工事については、概ね予定通りの進捗となっています。		
今後、12/27～1/5の年末年始休工を除いた土日祝日については、可能な限り工事を行うことで、		
これ以上の遅延がないように努めてまいります。		

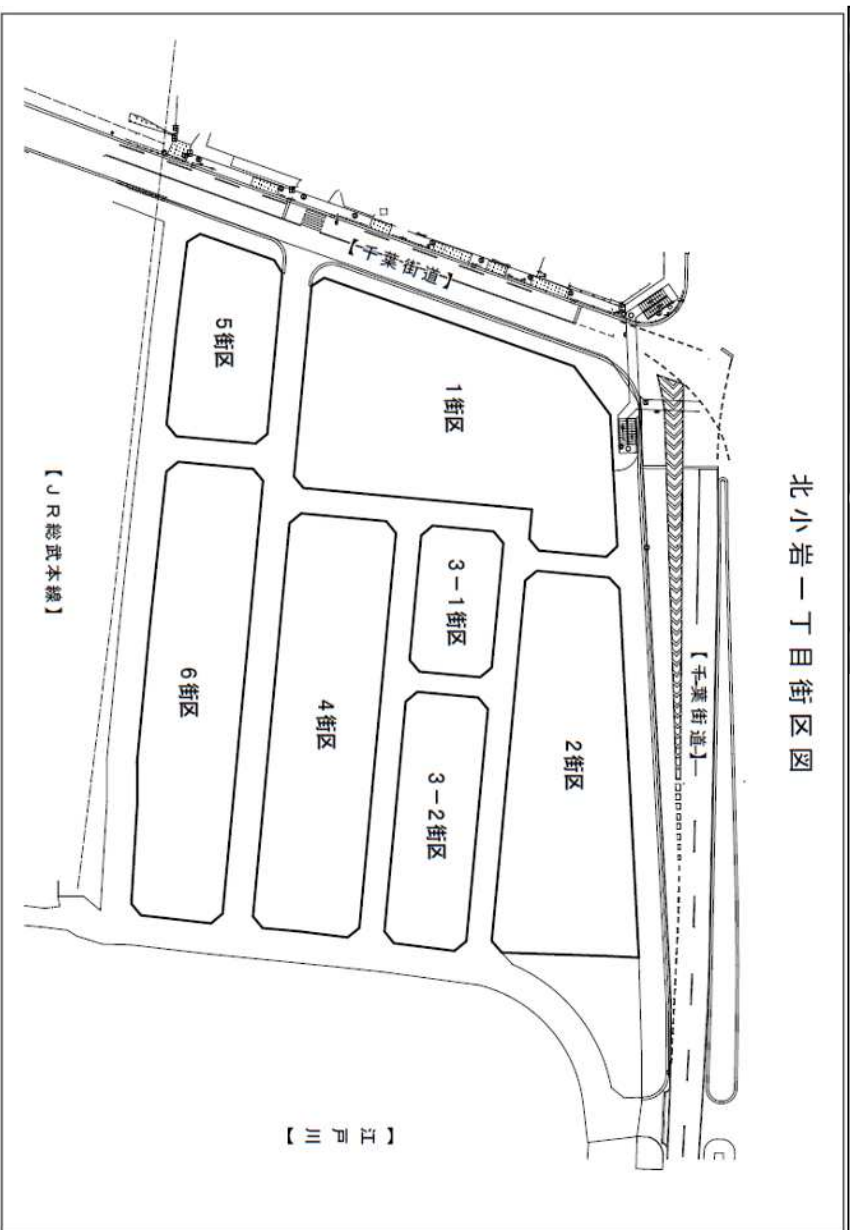

北小岩一丁目街区図
