# 古い春江橋

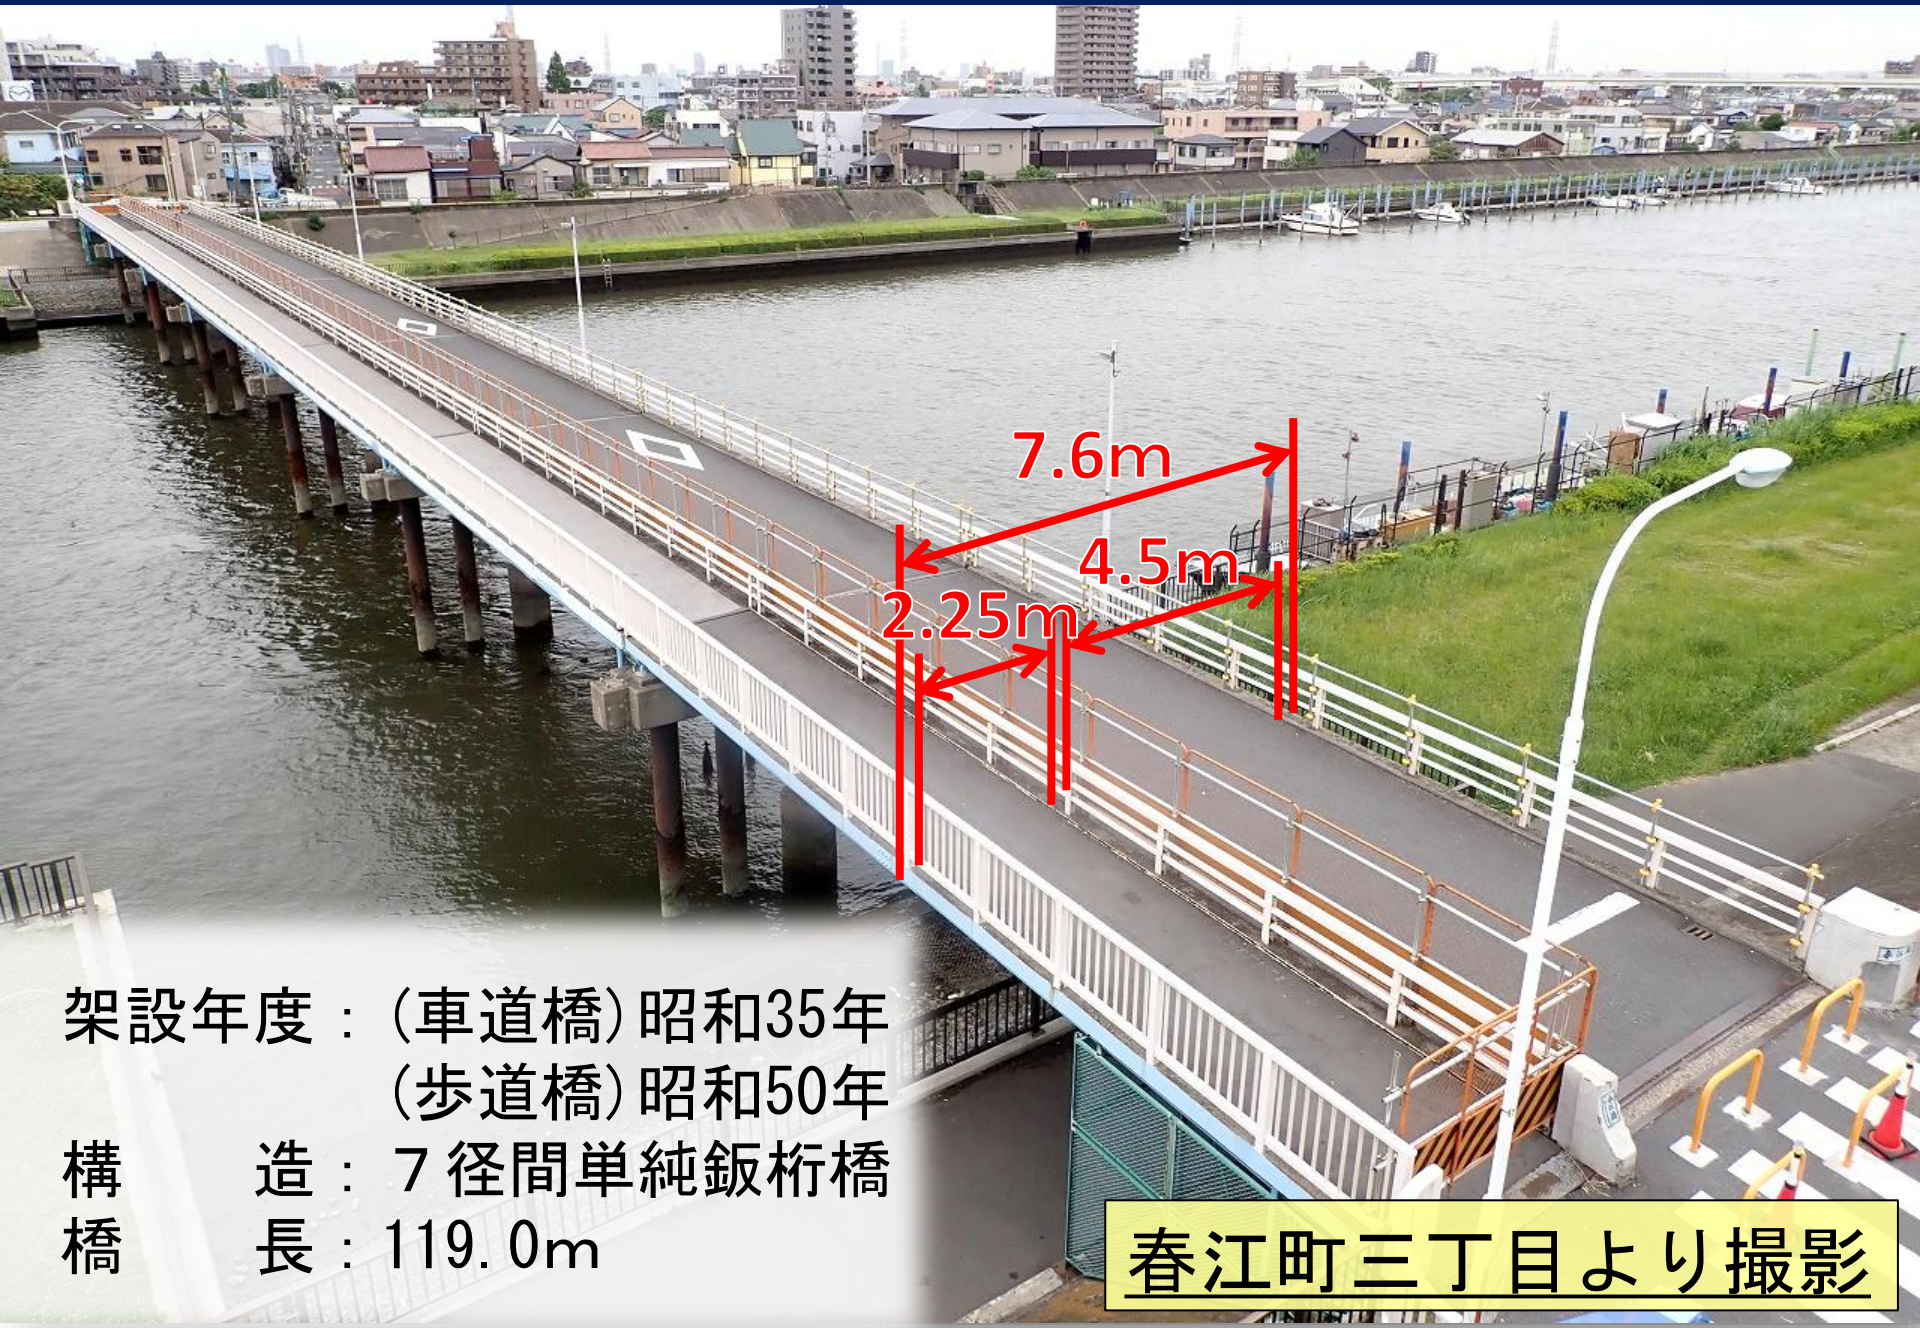


架設年度：（車道橋）昭和35年
（歩道橋）昭和50年
構　　造：７径間単純鈑桁橋
橋　　長：119.0m

春江町三丁目より撮影

# 新しい春江橋

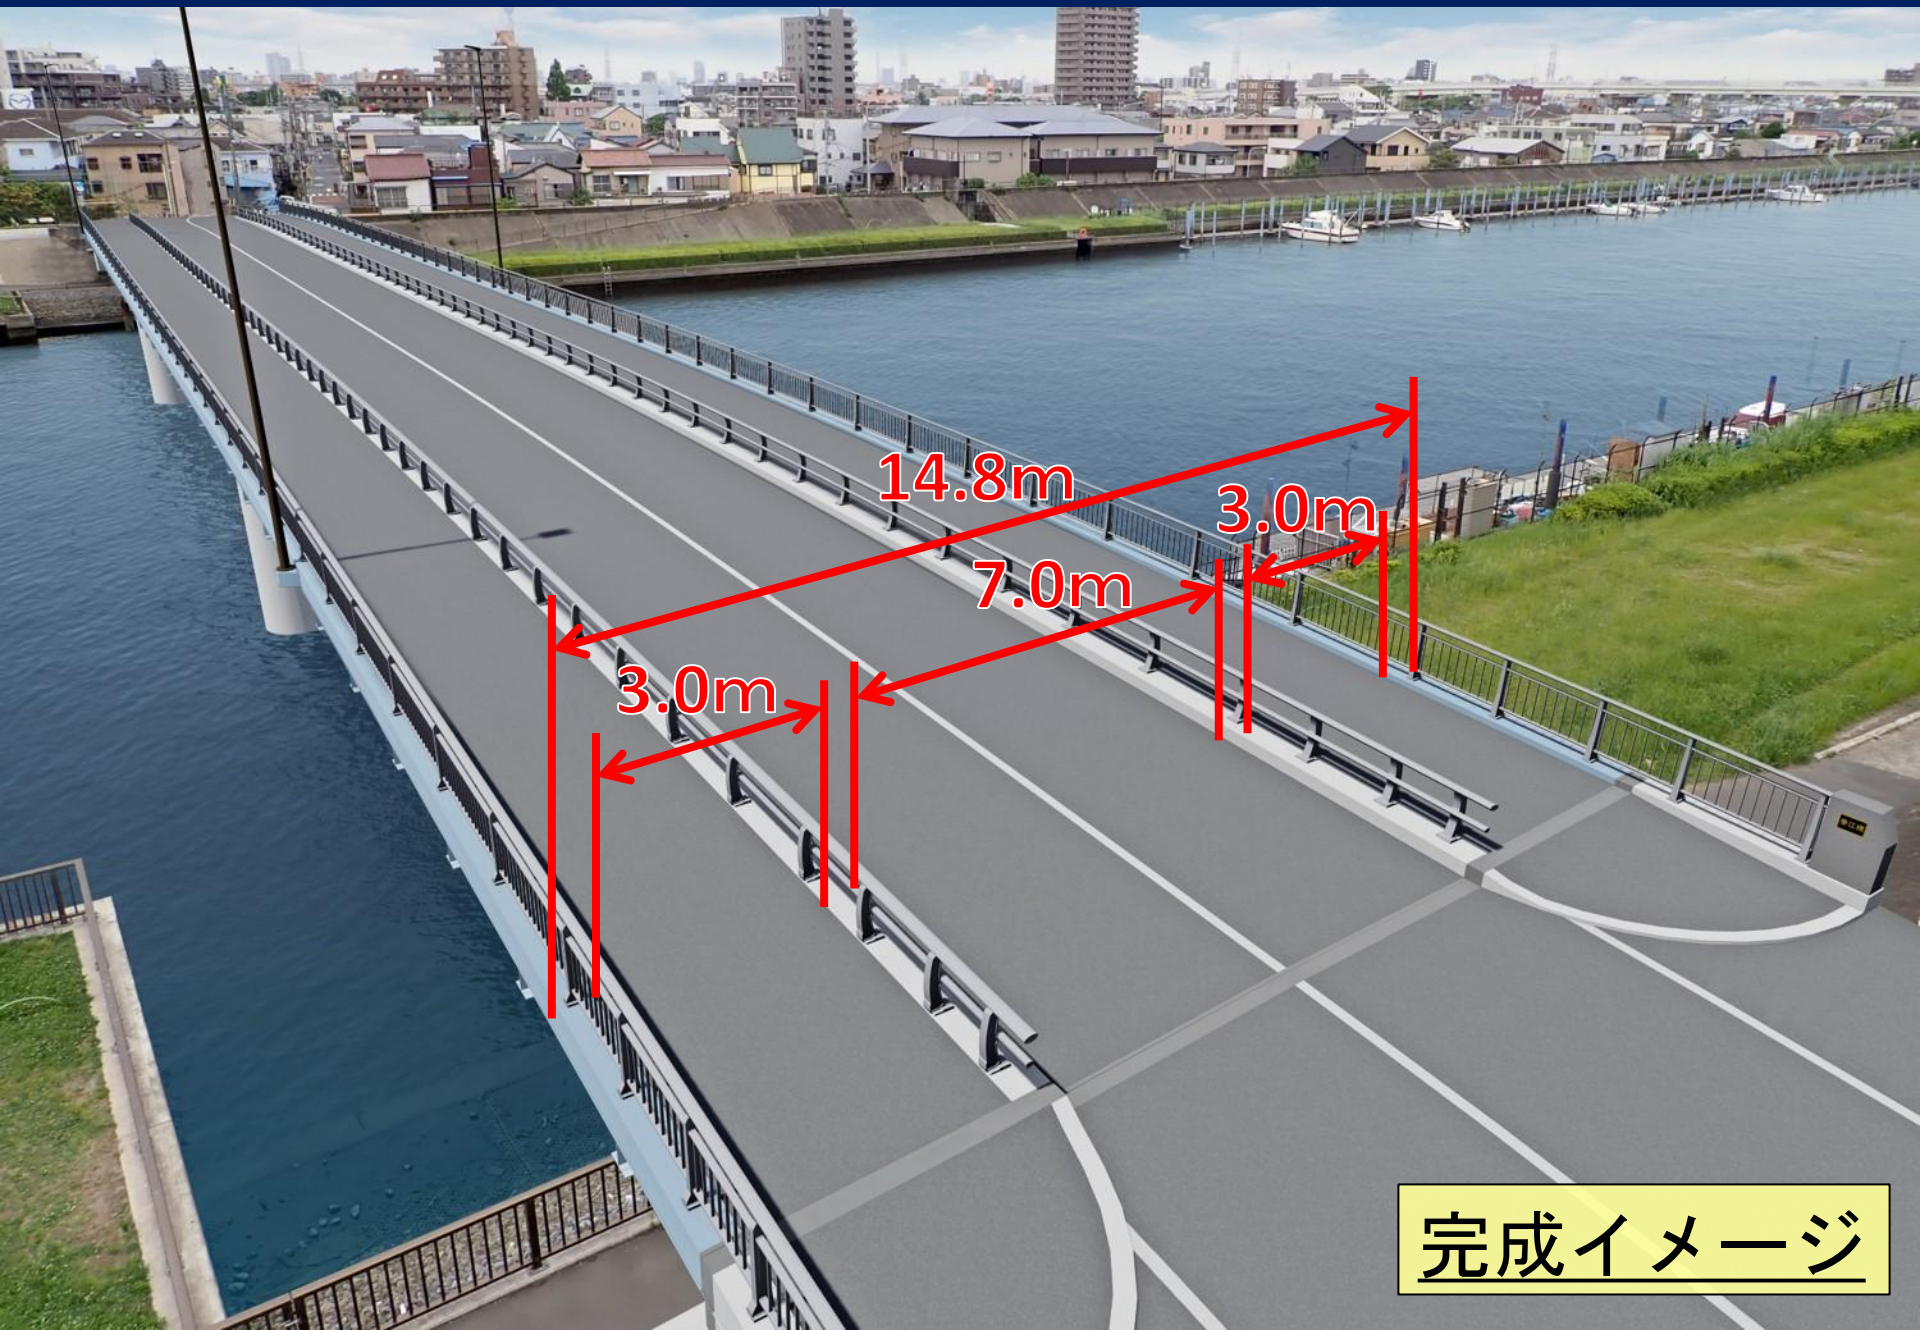

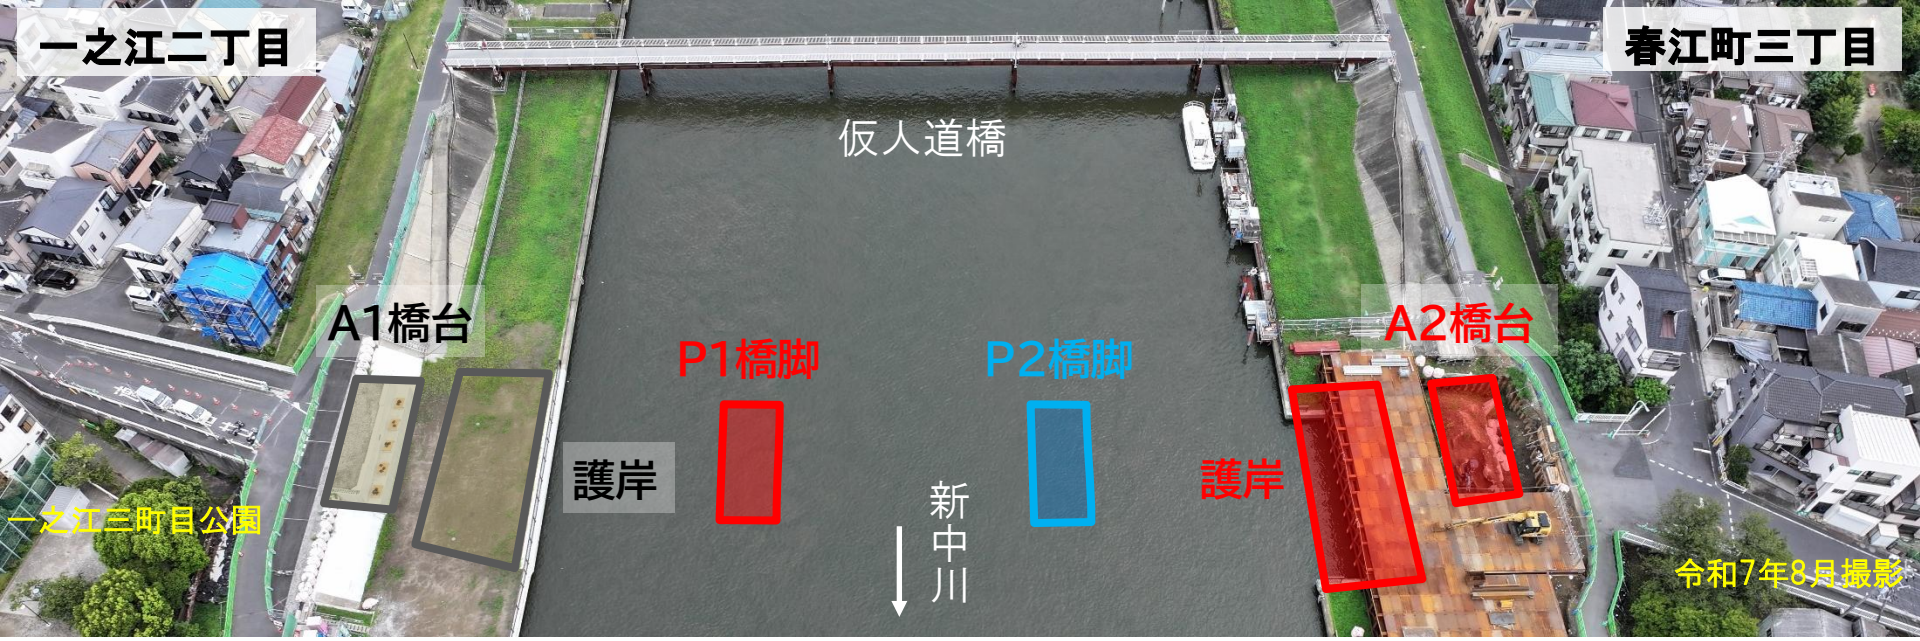


| 工種＼年度 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮人道橋 | 設置 | | | | | | 開通予定 | 撤去 |
| 旧橋 | 撤去 | 撤去 | | | | | | |
| 新橋 下部工 | | A1橋台 一之江側 | | A2橋台 春江町側 | | | | |
| | | | | P1橋脚 一之江側 | P2橋脚 春江町側 | | | |
| 新橋 上部工 | | | | | | 橋桁 製作・架設 | 橋面 仕上 | |
| 関連工事 | | | 護岸 一之江側 | 護岸 春江町側 | | 堤防耐震 取付道路 一之江側 | 堤防耐震 取付道路 春江町側 | アンダーパス |

凡例 施工済 施工中 施工予定

令和7年10月更新
